

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0496 26 70 12
e-mail: kristof.dm@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4849903
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/05/2017

Klant / Opdrachtgever:
De Mey Kristof
HOOGSTRAAT 5
9185 WACHTEBEKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: DE MEY KRISTOF HOOGSTRAAT 5 WACHTEBEKE 9185
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 10/05/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2042 Onderzoeker: SLABBAERT JIMMY
Eigendom van: -OPDRACHTGEVER
Installateur: -IDEM
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Schak.: Kies een item.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: < 30 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 0,5 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 27

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker


Ééndraadsschema kast A (Tuinhuis)


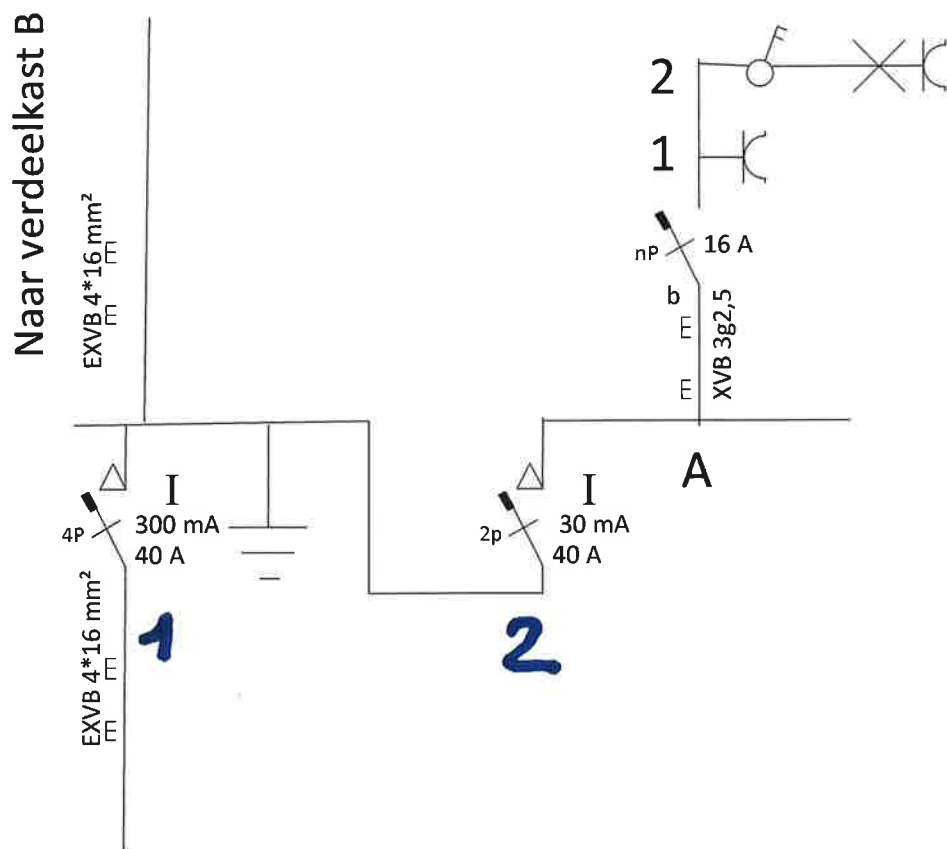


PV 100517-001


[Signature]
O.C.B.

Wp 0517-001
OCB

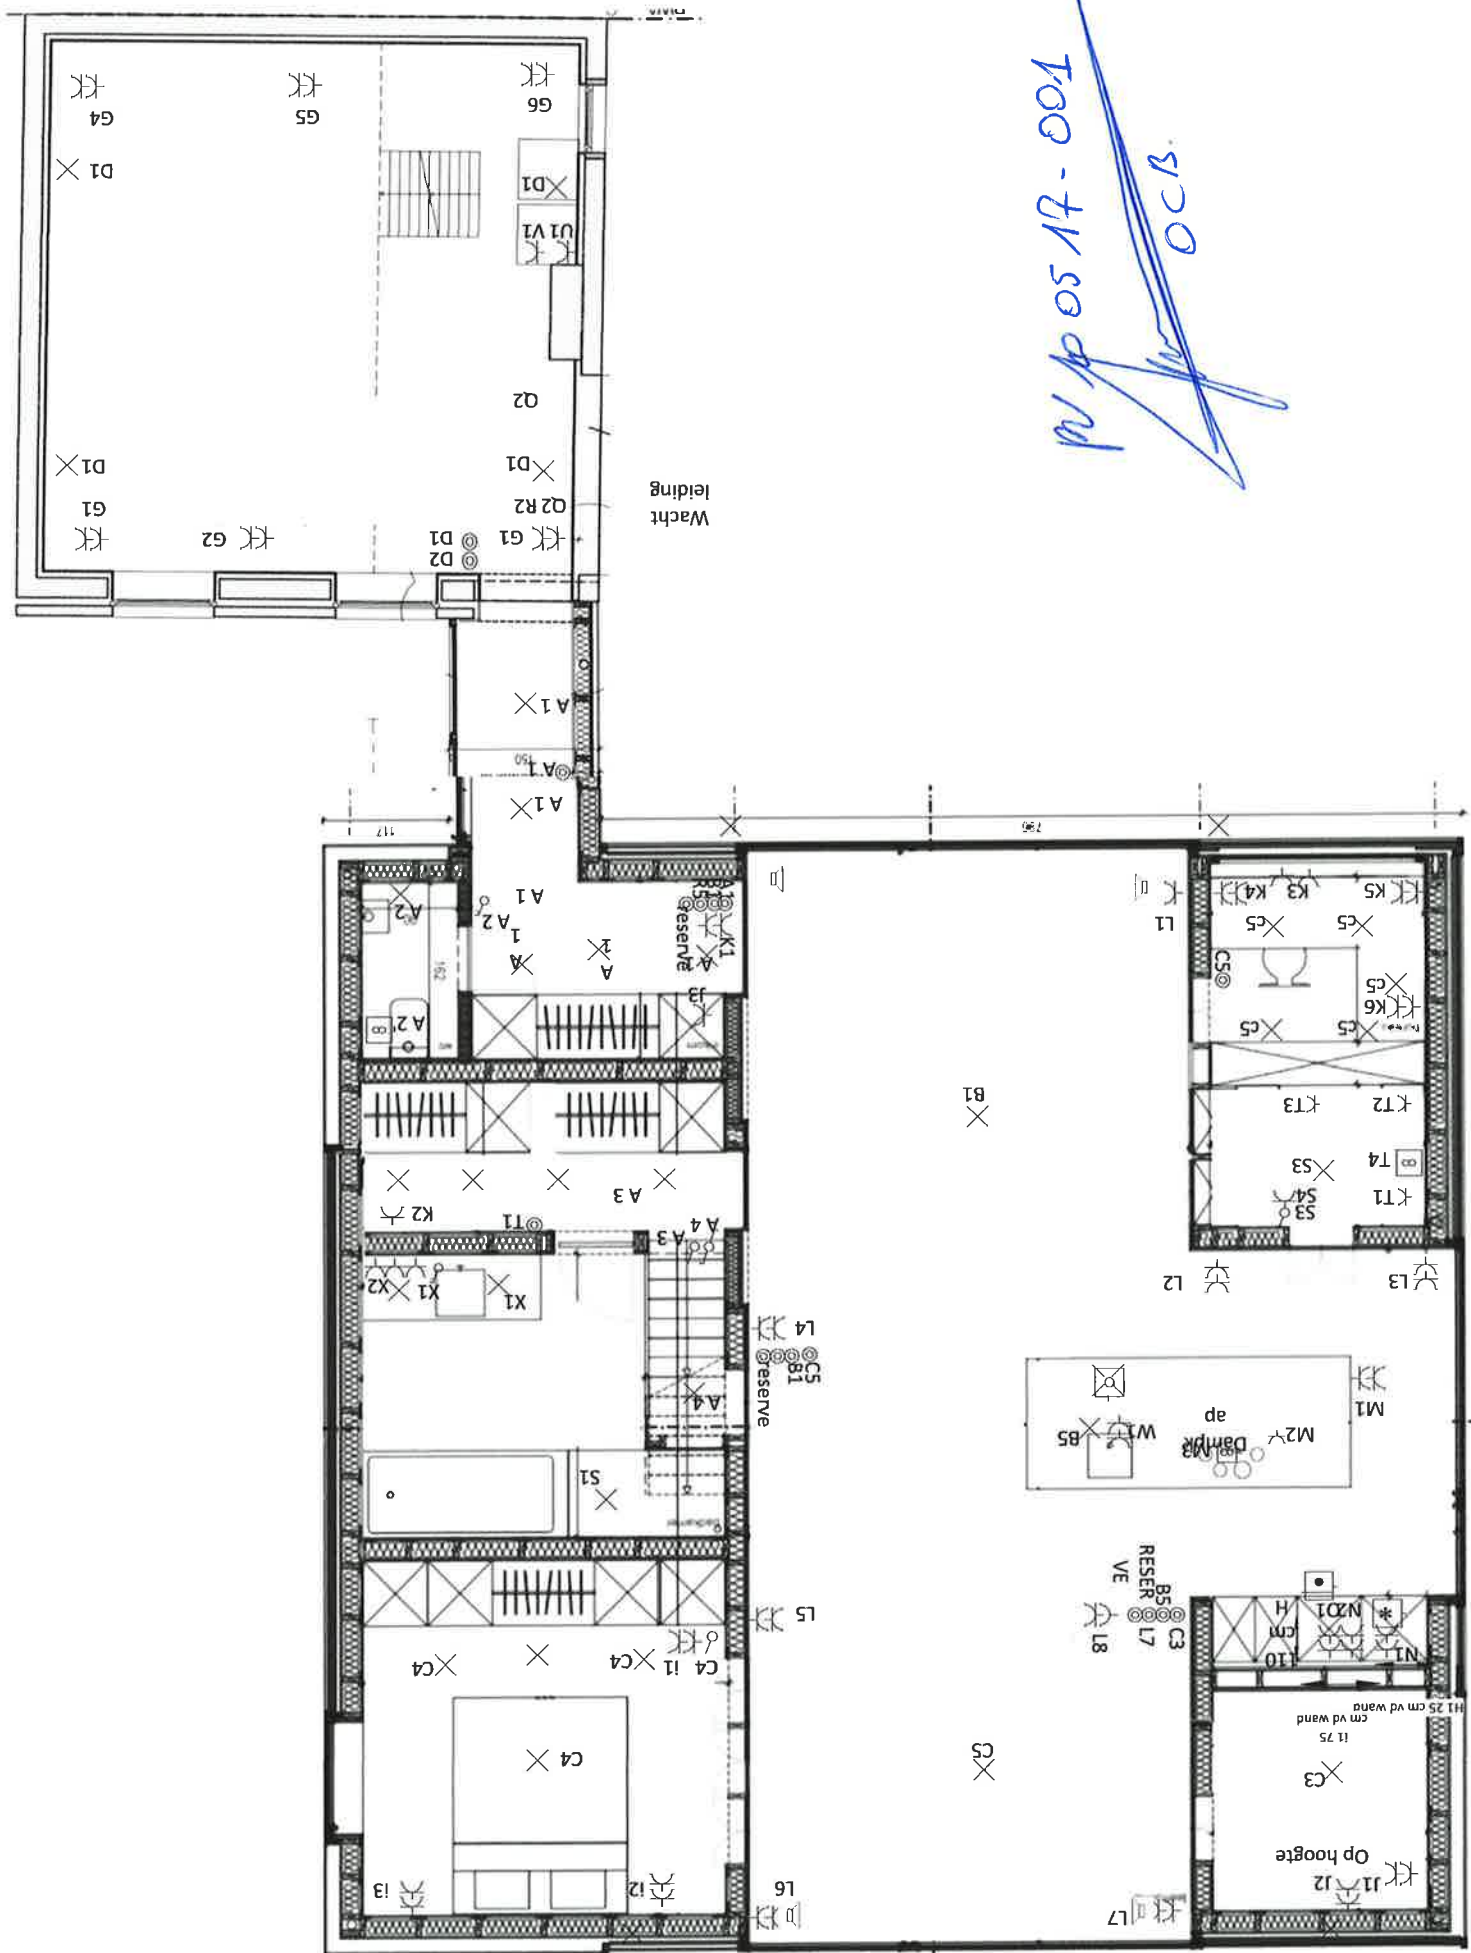

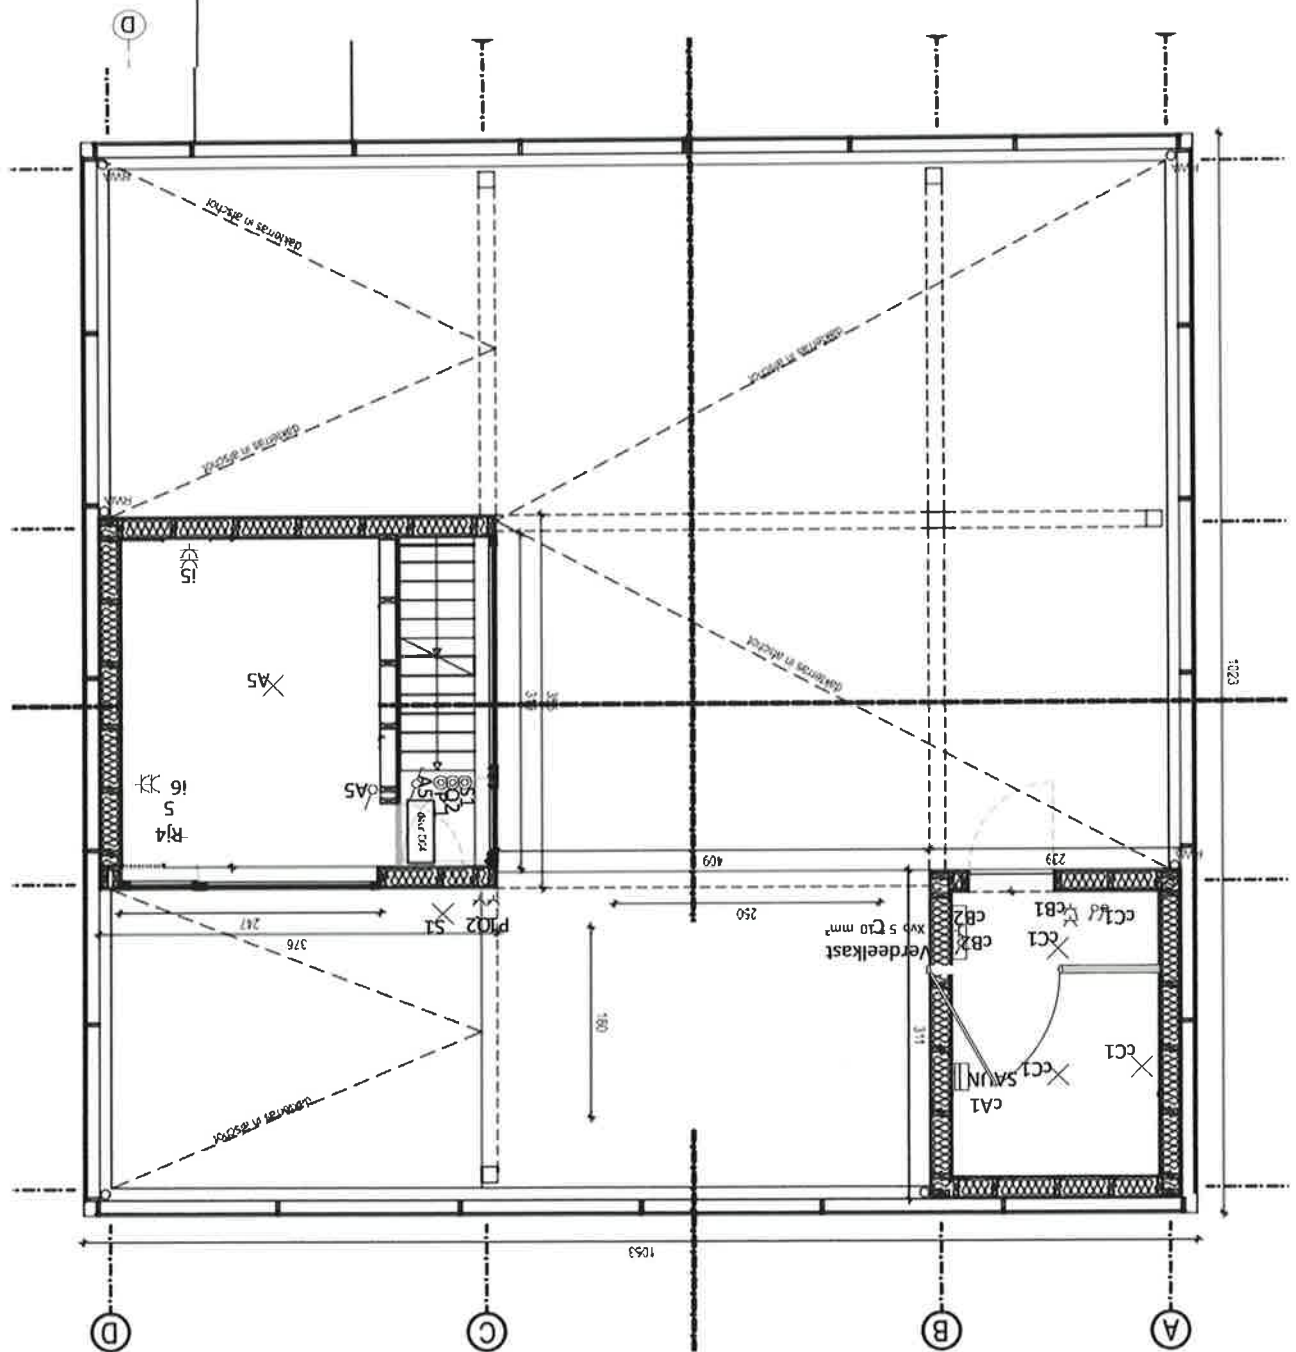


Verdeelkast B

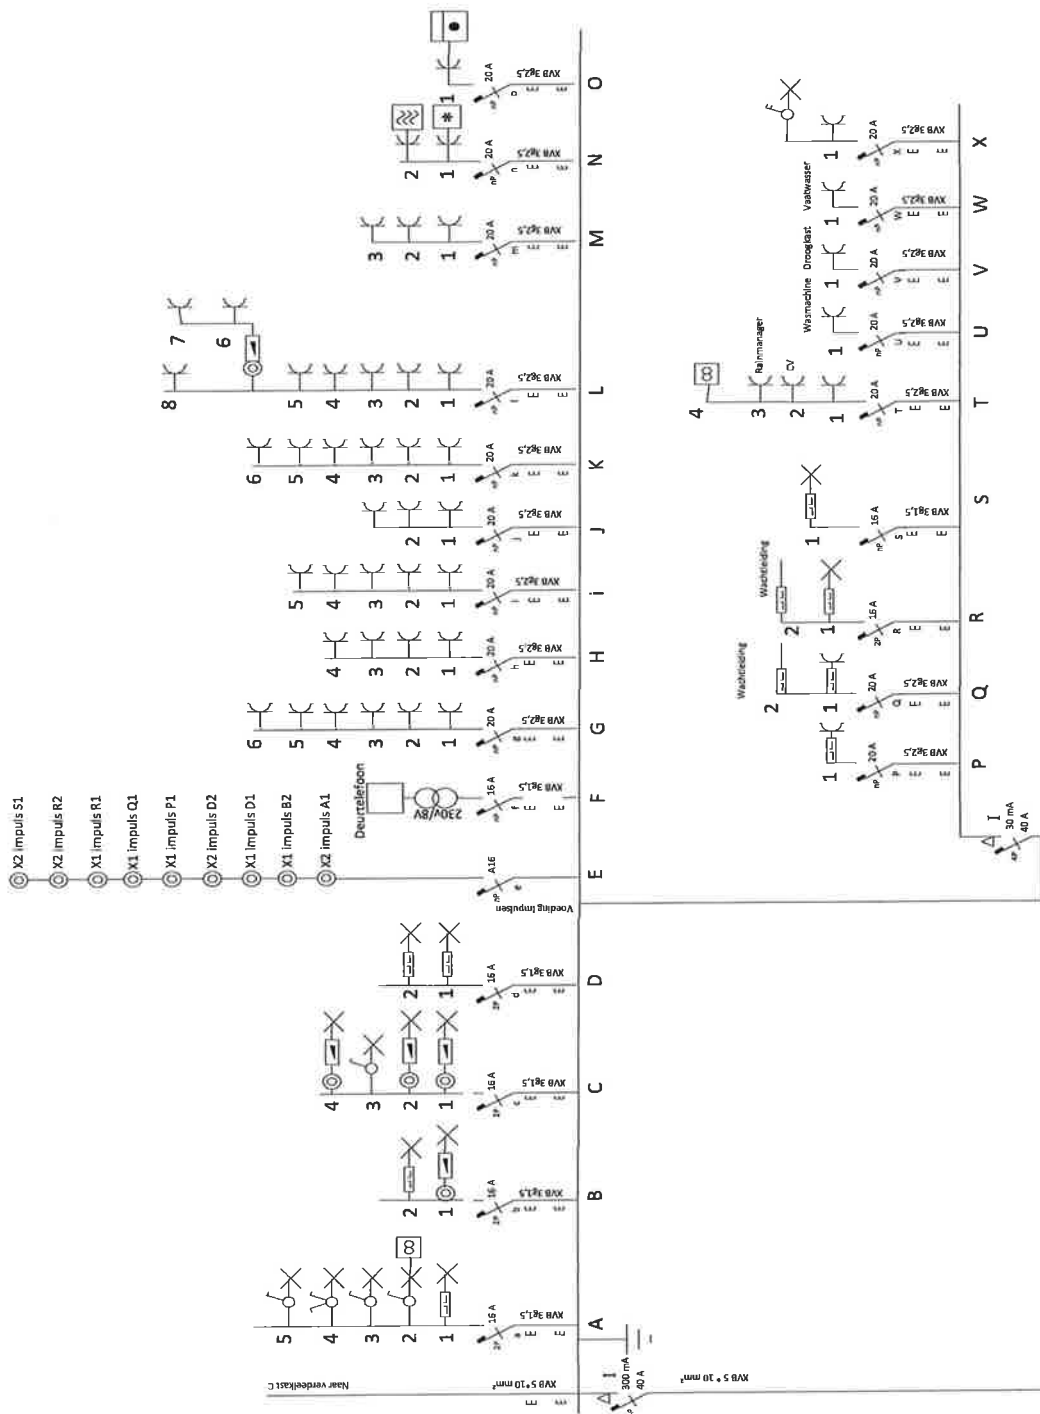

100-7150 of 10

0013

Éndraadsschema Kast C (Sauna)

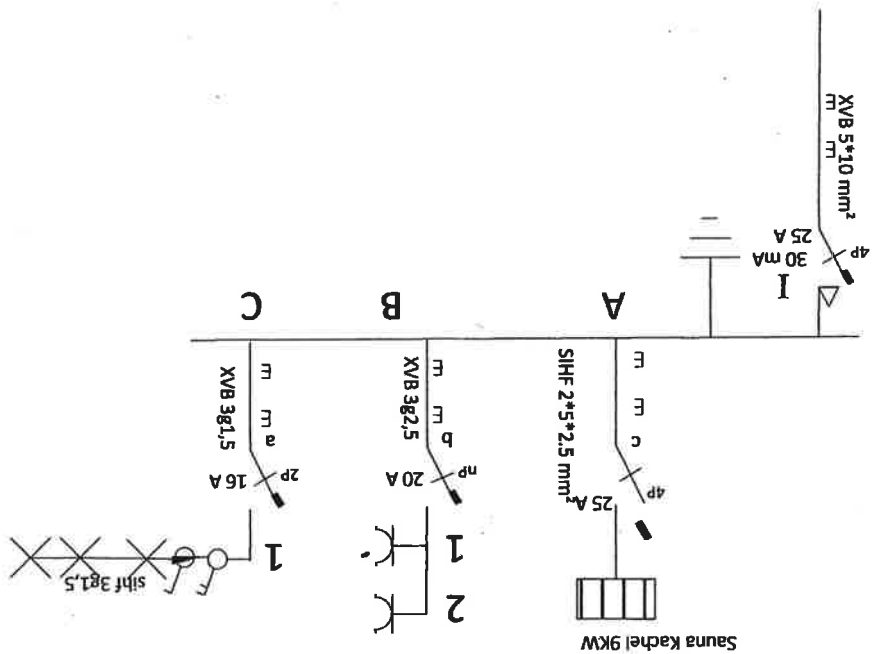

W 100511-001.
OCB
